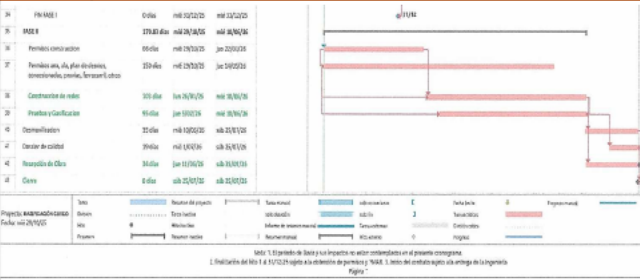
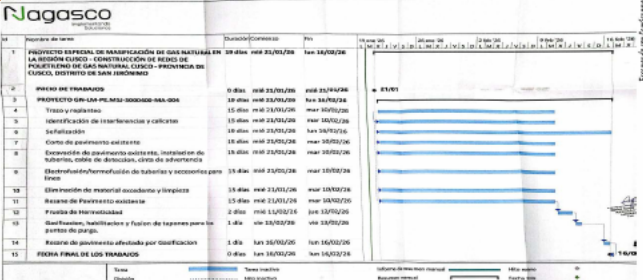
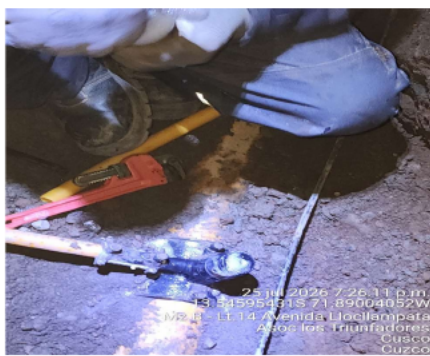
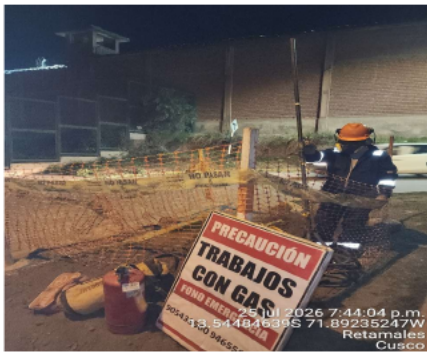


 		FORMATO		END-FPY-FI-04		
INFORME DIARIO DE TRABAJO - IDT				Fecha :	01-ago-25	
				Versión :	001	
PROYECTO:	CUS-03 - Red de distribución Sector 03			FORMA:	END-IDT-RED-CU-259-G1-25-07-2026	
SUPERVISIÓN:	Residente de obra			CONTRATISTA:	NAGASCO	
CLIENTE:	FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO - FISE			LUGAR DE SUPERVISIÓN:	Ca. Cauce Seco de Llocllopatá / Cusco	
				FECHA DE EJECUCIÓN:	08/09/2026	
ESPECIALIDAD CIVIL - MECÁNICA - ELÉCTRICA - INSTRUMENTACIÓN						
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE CONSTRUCTIVO						
						
						
RESUMEN EJECUTIVO - CONSTRUCCIÓN						
2.1	Permisos para la ejecución del proyecto				Comentarios	
2.1	Permisos de la 2 da fase al 100%				se firmó el acta de inicio de la 2 da fase 12-01-2026	
2.1	Recorrido informativo y difusión inicio de obra				Comentarios	
2.3	señalización y detección de interferencia				Comentarios	
2.3	Se realizó la señalización correspondiente de los trabajos de pruebas de gasificación y hermeticidad				Comentarios	
2.4	Excavación de calicatas				Comentarios	
3.1	OBSERVACIONES AUDITORIAS					
	RNC ABIERTAS	5	RNC ABIERTAS	5		
	RNC CERRADAS	9	RNC CERRADAS	9		
	TOTAL	14	TOTAL	14		
Se recibió propuesta de Acción correctiva RNC : RNC 019 / RNC 020/ RNC 021 / RNC023 / RNC024 se encuentran Abierta y sin subsanar						
GESTIÓN DEL TIEMPO (CRONOGRAMA)						
Permisos y coordinación en seguimiento. Continúan actividades documentarias, pruebas y cierre del proyecto.						
5						
5.1	CHARLA DE SEGURIDAD CAPACIDAD		5.3	TEMA		
	X			Prevenición de distracciones y trabajo seguro		
5.2	INCIDENTES		"Duelo distracción". EXPOSITORES Omar Edinson Chamorro			
	SI	NO	Describir si aplica. :			
	ACCIDENTES	SI	NO	Describir si aplica. :		
6						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
1	RESIDENTE	Und.	1	GRUPO DE PRUEBAS - HERMETICIDAD		
2	PREVENCIONISTA	Und.	1	GN-LM-PE-MSJ-S000400-MA-000-03/S000200-MA-000/S000500-MA-000/S000300-MA-000		
3	SUPERVISOR DE CONTROL CALIDAD	Und.	1	Extensión de red 25 mm: 3258.85 ml + PP:10.0ml		
4	TOPOGRAFO	Und.	0	Final P T°		
5	RELACIONISTA COMUNITARIO	Und.	1	CP Final 7.8Bar 16°C		
6	PERSONAL CIVIL	Und.	18	CS Final 7.8Bar 13°C		
7	CAPATAZ	Und.	1	Prueba de 24 Horas		
8	SUPERVISOR CONSTRUCTIVO	Und.	1	GN-LM-PE-MSJ-S000500-MA-001		
9	OPERADOR	Und.	3	Extensión de red 25 mm: 547.57 ml + PP:12.50ml		
10	FUSIONISTA	Und.	1	Final P T°		
				CP Final 8.1Bar 11°C		
				CS Final 8.1Bar 14°C		
				GN-LM-PE-MSJ-S000400-MA-006		
				Extensión de red 25 mm: 1345.54 ml + PP:10.0ml		
				Inicio P T°		
				CP Inicio 8.1Bar 24°C		
				CS Inicio 8.1Bar 24°C		
11	ARQUEOLOGA	Und.	1	GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-001		
				Extensión de red 25 mm:1891.44 ml		
				Gasificación 100% de metano(CH4)		
				presión de red:4.5bar		
				GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-002		
				Extensión de red 25 mm:1668.30 ml		
				Gasificación 100% de metano(CH4)		
				presión de red:4.5bar		
				GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-003		
				Extensión de red 25 mm:1390.10 ml		
				Gasificación 100% de metano(CH4)		
				presión de red:4.5bar		
				GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-004		
				Extensión de red 25 mm:1497.26 ml		
				Gasificación 100% de metano(CH4)		
				presión de red:4.5bar		
				GN-LM-PE-MSJ-S000200-MA-001		
				Extensión de red 25 mm:1104.71 ml		
				Gasificación 100% de metano(CH4)		
				presión de red:4.5bar		
				GN-LM-PE-MSJ-S000500-MA-003		
				Extensión de red 25 mm:1903.25 ml		
				Gasificación 100% de metano(CH4)		
				Total de reposición: -		
Total				TUBERIA INSTALADA Y ZANJA EXCAVADA:		
				FASE 2 GENERAL		
				Acumulado : ((24029.74/24029.76)*100)= 100%		
				FASE 1 - FASE 2		
				Acumulado : ((24994.94/24029.76)*100)= 100%		
				acumulado hasta la fecha 25-07-2026		
7						
ITEM	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES		
1	RETROEXCAVADORA	Und.	0	----		
2	CORTADORA	Und.	1	----		
3	MINICARGADOR	Und.	3	----		
4	CANGURO	Und.	2	----		
5	RODILLO	Und.	0	----		
Total				6		
8						
SUPERVISIÓN END PERU S.A.C.			6	PERSONAL		
SUPERVISIÓN F.I.S.E						
						
Ing. Tony Blas Cristóbal						
						
Ing. Francisco Benites Bocanegra						

 		FORMATO		END-FPY-FI-04	
INFORME DIARIO DE TRABAJO - IDT				Fecha :	01-ago.-25
				Versión :	001
PROYECTO:	"PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO"			N° INFORME :	END-IDT-RED-CU-258-G1-24-07-2026
SUPERVISIÓN:	END PERÚ S.A.C.	CONTRATISTA:	NAGASCO	LUGAR DE SUPERVISIÓN :	Ca Cauce Seco de Llocllopatá/Ca Andres Avelino Cáceres/Ca Los Triunfadores/Av de la Cultura/ Av Perú / Vía Expresa Sur- San Jerónimo
CLIENTE:	FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGÉTICO - FISE	HOJA:	2 DE 3	FECHA DE EJECUCIÓN :	sábado, 25 de Julio de 2026
ESPECIALIDAD CIVIL - MECÁNICA - ELECTRICA - INSTRUMENTACIÓN					
9 REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
1. Verificación de la charla de 5 minutos S000300-MA-000/S000500-MA-002/S000500-MA-003/S000400-MA-006		2. Verificación de la carpa primaria S000400-MA-000-03/S000200-MA-000/S000500-MA-000/S000300-MA-000		3. Verificación de la presión final CP de la línea de 200-110 mm P: 7.8 Bar	
					
4. Verificación de la carpa secundaria S000400-MA-000-03/S000200-MA-000/S000500-MA-000/S000300-MA-000		5. Verificación de la presión final CP de la línea de 200-110 mm P: 7.8 Bar		5. Verificación de la carpa Primaria S000400-MA-006	
					
7. Verificación de la presión inicial CP de la línea de 25 mm P: 8.1 Bar		8. CP Verificación de la temperatura Inicial T° 24°C		9. Se ejecutaron trabajos de excavación para la habilitación del punto de empalme previo a la gasificación de la red.	
					
10. Como actividad previa a la gasificación, se realizó la verificación de apertura y cierre de las poliválvulas de la red.		11. Se realizó el corte controlado de la tubería para ejecutar el empalme con el tramo de red gasificada.		12. Se ejecutó el empalme de la tubería mediante electrofusión, iniciando el tiempo de enfriamiento conforme al procedimiento establecido.	
SUPERVISIÓN END PERU S.A.C.			SUPERVISIÓN F.I.S.E		
  Tony Blas Cristóbal Supervisor Redes ISEP CIP 761882			 Ing. Francisco Benites Bocanegra		

 		FORMATO		END-FPY-FI-04	
INFORME DIARIO DE TRABAJO - IDT				Fecha :	01-ago-25
				Versión :	001
PROYECTO:	"PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"			N° INFORME :	END-IDT-RED-CU-258-G1-24-07-2026
SUPERVISIÓN	END PERÚ S.A.C.	CONTRATISTA	NAGASCO	LUGAR DE SUPRVISIÓN :	Ca Cauce Seco de Llocllopata/Ca Andres Avelino Caceres/Ca Los Triunfadores/Av de la Cultura/ Av Perú / Vía Expresa Sur- San Jeronimo
CLIENTE	FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGETICO - FISE	HOJA	3 DE 3	FECHA DE EJECUCIÓN :	sábado, 25 de Julio de 2026
ESPECIALIDAD CIVIL - MECANICA - ELECTRICA - INSTRUMENTACION					
9 REGISTRO FOTOGRAFICO					
 25 Jul 2026 6:03:10 p.m. 13.55017064S 71.87397436W 410 Condesa Cusco - Paucartambo Cuzco		 25 Jul 2026 6:25:51 p.m. 13.55017064S 71.87397436W 410 Condesa Cusco - Paucartambo Cuzco		 25 Jul 2026 6:47:44 p.m. 13.55017064S 71.87397436W 410 Condesa Cusco - Paucartambo Cuzco	
13. Se efectuó la apertura controlada de la poliválvula, habilitando el paso de gas natural hacia la red troncal.		14. Se realizó la verificación de hermeticidad del empalme por electrofusión mediante aplicación de agua jabonosa, descartándose la presencia de fugas		15. Se verificó el venteo en todos los puntos de purga de la red troncal, confirmando el desplazamiento del aire y la presencia de gas natural.	
 25 Jul 2026 6:51:27 p.m. 13.55006105S 71.8836829W b2 Calle Sorama Cusco Cuzco		 25 Jul 2026 7:22:07 p.m. 13.54986292S 71.89009956W Mz.B - Lt.13 Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cusco Cuzco		 25 Jul 2026 7:26:11 p.m. 13.54986292S 71.89009956W Mz.B - Lt.13 Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cusco Cuzco	
16. Se verificó, mediante detector multigás, una concentración del 100 % de gas natural en todos los puntos de purga de la red troncal, confirmando la culminación del proceso de venteo		17. Se inició la perforación de la tubería gasificada para habilitar el suministro de gas natural hacia las demás mallas del proyecto.		18. Se verificó la hermeticidad de todos los Tapping Tee ejecutados en las mallas gasificadas mediante aplicación de agua jabonosa, descartándose la presencia de fugas.	
 25 Jul 2026 7:44:04 p.m. 13.54846395S 71.89235247W Retamales Cusco		 25 Jul 2026 9:25:52 p.m. 13.54805026S 71.88553216W 112 Prolongación de la Cultura Cusco Cuzco		 25 Jul 2026 8:17:59 p.m. 13.54457023S 71.88947588W Mz. A Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cusco Cuzco	
19. Se realizó el venteo en todos los puntos de purga de las mallas primarias, verificando el desplazamiento del aire y la llegada de gas natural.		20. Se verificó, mediante detector multigás, una concentración del 100 % de metano en todos los puntos de purga de las mallas gasificadas, confirmando la culminación del proceso de venteo.		21. Se realizó la verificación de la presión de operación de la red en todas las mallas gasificadas, constatando valores conforme a los parámetros establecidos.	
 25 Jul 2026 8:18:06 p.m. 13.54846395S 71.88947588W Mz. A Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cusco Cuzco					
22. Se verificó una presión de operación de 4.2 bar en todas las mallas gasificadas, confirmando condiciones normales de funcionamiento					
SUPERVISIÓN END PERU S.A.C.			SUPERVISIÓN F.I.S.E		
 END Tony Blas Cristobal Supervision Redes IDT CIP 252842			 Ing. Francisco Benites Bocanegra		
Ing. Tony Blas Cristobal			Ing. Francisco Benites Bocanegra		
