
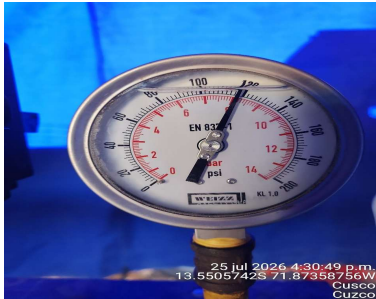
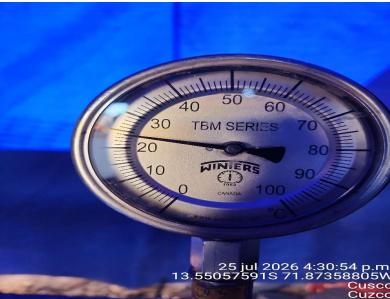
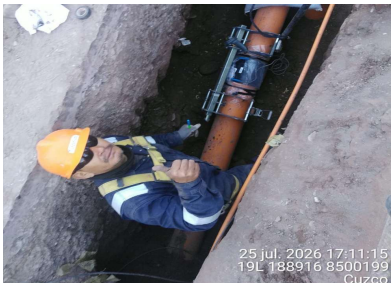
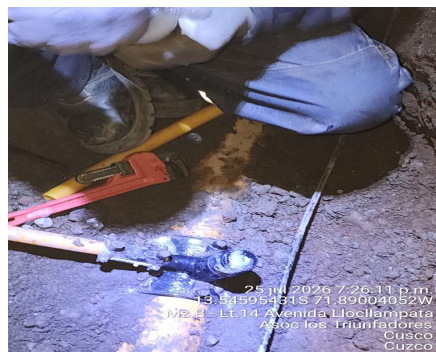
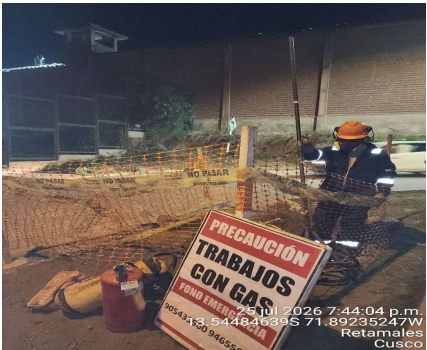


		FORMATO		END-FPY-FI-04	
INFORME DIARIO DE TRABAJO - IDT				Fecha :	01-ago.-25
				Versión :	001
PROYECTO.	"PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"			N° INFORME :	END-IDT-RED-CU-258-G1-24-07-2026
SUPERVISIÓN	END PERÚ S.A.C.	CONTRATISTA	NAGASCO	LUGAR DE SUPERVISIÓN :	Ca Cauce Seco de Lloclopatata/Ca Andres Avelino Caceres/Ca Los Triunfadores/Av de la Cultural/ Av Perú / Vía Expresa Sur- San Jeronimo
CLIENTE	FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGETICO - FISE	HOJA	2 DE 3	FECHA DE EJECUCIÓN :	sábado, 25 de Julio de 2026
ESPECIALIDAD CIVIL - MECÁNICA - ELECTRICA - INSTRUMENTACIÓN					
9 REGISTRO FOTOGRÁFICO					
					
1. Verificación de la charla de 5 minutos S000300-MA-000/S000500-MA-002/S000500-MA-003/S000400-MA-006		2. Verificación de la carpa primaria S000400-MA-000-03/S000200-MA-000/S000500-MA-000/S000300-MA-000		3. Verificación de la presión final CP de la línea de 200-110 mm P: 7.8 Bar	
					
4. Verificación de la carpa secundaria S000400-MA-000-03/S000200-MA-000/S000500-MA-000/S000300-MA-000		5. Verificación de la presión final CP de la línea de 200-110 mm P: 7.8 Bar		5. Verificación de la carpa Primaria S000400-MA-006	
					
7. Verificación de la presión inicial CP de la línea de 25 mm P: 8.1 Bar		8. CP Verificación de la temperatura Inicial T° 24°C		9. Se ejecutaron trabajos de excavación para la habilitación del punto de empalme previo a la gasificación de la red.	
					
10. Como actividad previa a la gasificación, se realizó la verificación de apertura y cierre de las poliválvulas de la red.		11. Se realizó el corte controlado de la tubería para ejecutar el empalme con el tramo de red gasificada.		12. Se ejecutó el empalme de la tubería mediante electrofusión, iniciando el tiempo de enfriamiento conforme al procedimiento establecido.	
SUPERVISIÓN END PERU S.A.C.			SUPERVISIÓN F.I.S.E		
 END Tony Blas Cristobal Supervisión Redes HOP CIP 262842			 Ing. Francisco Benites Bocanegra		

END FISE		FORMATO		END-FPY-FI-04	
INFORME DIARIO DE TRABAJO - IDT				Fecha	01-ago.-25
				Versión	001
PROYECTO.	"PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"			Nº INFORME	END-IDT-RED-CU-258-G1-24-07-2026
SUPERVISIÓN	END PERÚ S.A.C.	CONTRATISTA	NAGASCO	LUGAR DE SUPRVISIÓN	Ca Cauce Seco de Llocllopatá/Ca Andres Avelino Caceres/Ca Los Triunfadores/Av de la Cultura/ Av Perú / Vía Expresa Sur- San Jeronimo
CLIENTE	FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGETICO - FISE	HOJA	3 DE 3	FECHA DE EJECUCIÓN	sábado, 25 de Julio de 2026
ESPECIALIDAD CIVIL - MECANICA - ELECTRICA - INSTRUMENTACION					
9REGISTRO FOTOGRAFICO					
 25 Jul 2026 6:03:10 p.m. 13.55017064S 71.87393736W 410 Camisera Cusco - Paucartambo Cuzco Cuzco		 25 Jul 2026 6:03:10 p.m. 13.55017064S 71.87393736W 410 Camisera Cusco - Paucartambo Cuzco Cuzco		 25 Jul 2026 6:03:10 p.m. 13.55017064S 71.87393736W 410 Camisera Cusco - Paucartambo Cuzco Cuzco	
13. Se efectuó la apertura controlada de la poliválvula, habilitando el paso de gas natural hacia la red troncal.		14. Se realizó la verificación de hermeticidad del empalme por electrofusión mediante aplicación de agua jabonosa, descartándose la presencia de fugas		15. Se verificó el venteo en todos los puntos de purga de la red troncal, confirmando el desplazamiento del aire y la presencia de gas natural.	
 25 Jul 2026 6:51:27 p.m. 13.5500616S 71.8836825W b2 Calle Sorama Cuzco Cuzco		 25 Jul 2026 7:22:07 p.m. 13.54985252S 71.89009996W Mz.B - Lt.13 Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cuzco Cuzco		 25 Jul 2026 7:26:11 p.m. 13.54985252S 71.89009996W Mz.B - Lt.14 Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cuzco Cuzco	
16. Se verificó, mediante detector multigás, una concentración del 100 % de gas natural en todos los puntos de purga de la red troncal, confirmando la culminación del proceso de venteo		17. Se inició la perforación de la tubería gasificada para habilitar el suministro de gas natural hacia las demás mallas del proyecto.		18. Se verificó la hermeticidad de todos los Tapping Tee ejecutados en las mallas gasificadas mediante aplicación de agua jabonosa, descartándose la presencia de fugas.	
 25 Jul 2026 7:44:04 p.m. 13.5482639S 71.89235247W Retamales Cuzco Cuzco		 25 Jul 2026 9:25:52 p.m. 13.54806026S 71.8858216W 112 Prolongación de la Cultura Cuzco Cuzco		 25 Jul 2026 8:17:59 p.m. 13.54457023S 71.88947588W Mz. A Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cuzco Cuzco	
19. Se realizó el venteo en todos los puntos de purga de las mallas primarias, verificando el desplazamiento del aire y la llegada de gas natural.		20. Se verificó, mediante detector multigás, una concentración del 100 % de metano en todos los puntos de purga de las mallas gasificadas, confirmando la culminación del proceso de venteo.		21. Se realizó la verificación de la presión de operación de la red en todas las mallas gasificadas, constatando valores conforme a los parámetros establecidos.	
 25 Jul 2026 8:18:06 p.m. 13.54457023S 71.88947588W Mz. A Avenida Llocllampata Asoc los Triunfadores Cuzco Cuzco					
22. Se verificó una presión de operación de 4.2 bar en todas las mallas gasificadas, confirmando condiciones normales de funcionamiento					
SUPERVISIÓN END PERU S.A.C.			SUPERVISIÓN F.I.S.E		
END Tony Blas Cristobal Supervision Redes HD® CIP 262842			END Francisco Benites Bocanegra Supervision Redes HD® CIP 262842		
Ing. Tony Blas Cristobal			Ing. Francisco Benites Bocanegra		
