

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | FORMATO        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | END-FPY-FI-05          |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------|--------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----|----------------|-------------|-------|-------------------------|---------|
| INFORME SEMANAL DE TRABAJO - ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha :                | 01-ago.-25                                                                       |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Versión :              | 001                                                                              |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| PROYECTO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATISTA :          | NAGASCO                                                                          |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| SUPERVISIÓN. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | END PERU S.A.C.                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LUGAR DE SUPERVISIÓN : | Vía expresa sur/ Los Nogales / Av. La Cultura / Av. 8 de Diciembre -San Jeronimo |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| CLIENTE. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGETICO - FISE                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DEL INFORME :    | domingo, 9 de Agosto de 2026                                                     |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| PLAZO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 270 Dias                                                                                                                                | HOJA           | 1 DE 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MONTO CONTRACTUAL :    | \$ 5,552,825.29 +. IGV                                                           |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| AVANCE FASE1 - FASE2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00%                                                                                                                                 | AVANCE FASE 2: | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° INFORME :           | ISO - CU - REDES - 039                                                           |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| AVACE PRUEBAS DE HERMETICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100.00%                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PERIODO (DEL - AL) :   | 03-ago.-26 09-ago.-26                                                            |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| I RESUMEN DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>COMUNICACIONES</th> <th>EMITIDOS</th> <th>RESPONDIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Requerimiento de Información (RFI)</td> <td>0</td> <td>000</td> </tr> <tr> <td>Comunicación NAGASCO - END</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Comunicación END - FISE</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                | COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EMITIDOS               | RESPONDIDOS                                                                      | Requerimiento de Información (RFI)                   | 0                                                     | 000                                                    | Comunicación NAGASCO - END                               | 6                                                        | 6                                                    | Comunicación END - FISE                              | 4                                                   | 4                                                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGURIDAD Y SALUD LABORAL</th> <th>ANTER.</th> <th>ACTUAL</th> <th>ACUM.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes</td> <td>0</td> <td>000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Incidentes</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Días Perdidos</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>000</td> </tr> </tbody> </table> |                         |         | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | ANTER.                           | ACTUAL  | ACUM. | Accidentes                                          | 0       | 000   | 0                                                 | Incidentes | 2     | 0                                                  | 2       | Días Perdidos | 000                               | 000     | 000    |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| COMUNICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EMITIDOS                                                                                                                                | RESPONDIDOS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Requerimiento de Información (RFI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                       | 000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Comunicación NAGASCO - END                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                                                                                                       | 6              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Comunicación END - FISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                       | 4              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| SEGURIDAD Y SALUD LABORAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANTER.                                                                                                                                  | ACTUAL         | ACUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Accidentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                       | 000            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Incidentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                       | 0              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Días Perdidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000                                                                                                                                     | 000            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>MANO DE OBRA</th> <th>NAGASCO</th> <th>SUB. CONTRAT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mano de Obra Directa</td> <td>35</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mano de Obra Staff</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DE PERSONAS EN OBRA</b></td> <td><b>44</b></td> <td><b>0</b></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                | MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAGASCO                | SUB. CONTRAT.                                                                    | Mano de Obra Directa                                 | 35                                                    | 0                                                      | Mano de Obra Staff                                       | 9                                                        | 0                                                    | <b>TOTAL DE PERSONAS EN OBRA</b>                     | <b>44</b>                                           | <b>0</b>                                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIO AMBIENTE</th> <th>ANTER.</th> <th>ACTUAL</th> <th>ACUM.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Accidentes</td> <td>000</td> <td>000</td> <td>000</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                 |                         |         | MEDIO AMBIENTE            | ANTER.                           | ACTUAL  | ACUM. | Accidentes                                          | 000     | 000   | 000                                               |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAGASCO                                                                                                                                 | SUB. CONTRAT.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Mano de Obra Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                                                                                                                      | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Mano de Obra Staff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9                                                                                                                                       | 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <b>TOTAL DE PERSONAS EN OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>44</b>                                                                                                                               | <b>0</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| MEDIO AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANTER.                                                                                                                                  | ACTUAL         | ACUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Accidentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                                                                                                                     | 000            | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| II CONTROL DE PROYECTO - RESTRICCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <p>Actualmente la contratista cuenta con un grupo de reposición, realizando trabajos de las siguientes mallas ( S000400-MA-000-04/ S000400-MA-002/S000300-MA-000/S000400-MA-000-03 / S000500-MA-000 /S000500-MA-001/S000500-MA-002/S000500-MA-003/S000400-MA-000-02), actualmente se encuentra con retrasos de reposición en asfalto 1,295.15 ml, y concreto pendiente de reponer 111.85 ml la cual está aun dentro de los días hábiles por reponer sin embargo la malla S000300-MA-004 se encuentra observado los trabajos de reposición de una longitud de 76.7 ml.( trabajos de la semana 21), de igual manera la malla S000200-MA-002 se encuentra observado los trabajos de reposición de una longitud de 100.0 ml.( trabajos de la semana 25) en ese sentido la reposición pendiente de asfalto y rígido asciende en 1,407.00 ml por reponer, el proyecto S000200-MA-002 /S000300-MA-004 cuenta con no conformidad por reposición de asfalto en temperaturas bajas -NGC viene realizando trabajos de reposición de pavimento flexible, rígido y levantamiento de observaciones, el 04-08-26 la mezcla asfáltica fue observado y rechazado por NGC -el 08/09-08-2026 se tenía programado trabajos de reposición de asfalto, por inconvenientes técnicos de los proveedores de NGC no se llegó a realizar los trabajos. -Conforme a la Carta N.° 01356-2026-FISE, se aprobó la modificación del trazo mediante la desestimación de determinados tramos, actualizándose el metrado asignado del proyecto para el seguimiento de los indicadores de avance. -En esta semana la contratista no ha presentado ninguna factura o presupuesto de valorización ejecutado</p> |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>2.1</th> <th>PARTE CIVIL</th> <th>% DE AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.1.1</td><td>recorrido informativo y inicio de obra</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.2</td><td>señalización y detección de interferencia</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.3</td><td>Excavación de calicatas</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.4</td><td>Corte de pavimento</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.5</td><td>Rotura y demolición de pavimento</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.6</td><td>Excavación de zanja</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.7</td><td>Bajado de tubería</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.8</td><td>Relleno</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2.1.9</td><td>compactación de base y Sub base</td><td>99.70%</td></tr> <tr><td>2.1.10</td><td>Reposición de Pavimento</td><td>92.84%</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PARTE CIVIL            | % DE AVANCE                                                                      | 2.1.1                                                | recorrido informativo y inicio de obra                | 100.00%                                                | 2.1.2                                                    | señalización y detección de interferencia                | 100.00%                                              | 2.1.3                                                | Excavación de calicatas                             | 100.00%                                             | 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Corte de pavimento      | 100.00% | 2.1.5                     | Rotura y demolición de pavimento | 100.00% | 2.1.6 | Excavación de zanja                                 | 100.00% | 2.1.7 | Bajado de tubería                                 | 100.00%    | 2.1.8 | Relleno                                            | 100.00% | 2.1.9         | compactación de base y Sub base   | 99.70%  | 2.1.10 | Reposición de Pavimento        | 92.84%  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2.2</th> <th>PARTE MECÁNICA</th> <th>% DE AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.2.1</td><td>Soldadura de tubería pe</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table> |                                                      |        | 2.2 | PARTE MECÁNICA | % DE AVANCE | 2.2.1 | Soldadura de tubería pe | 100.00% |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARTE CIVIL                                                                                                                             | % DE AVANCE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | recorrido informativo y inicio de obra                                                                                                  | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | señalización y detección de interferencia                                                                                               | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Excavación de calicatas                                                                                                                 | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Corte de pavimento                                                                                                                      | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rotura y demolición de pavimento                                                                                                        | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Excavación de zanja                                                                                                                     | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bajado de tubería                                                                                                                       | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Relleno                                                                                                                                 | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | compactación de base y Sub base                                                                                                         | 99.70%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reposición de Pavimento                                                                                                                 | 92.84%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PARTE MECÁNICA                                                                                                                          | % DE AVANCE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soldadura de tubería pe                                                                                                                 | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>2.3</th> <th>PRUEBA DE HERMETICIDAD</th> <th>% DE AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.3.1</td><td>Prueba de hermeticidad ( 24 horas)</td><td>100.00%</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                  | 2.3                                                  | PRUEBA DE HERMETICIDAD                                | % DE AVANCE                                            | 2.3.1                                                    | Prueba de hermeticidad ( 24 horas)                       | 100.00%                                              |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRUEBA DE HERMETICIDAD                                                                                                                  | % DE AVANCE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prueba de hermeticidad ( 24 horas)                                                                                                      | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Comentarios :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                | <p>MALLAS INTERVENIDAS DURANTE LA SEMANA 32 ( DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DEL 2026)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                | <p>Comentarios :</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                | <p><b>GRUPO DE REPOSICIÓN</b></p> <table> <tr> <td>GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-004<br/>MI repuesto: 28.70 ml</td> <td>GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-002<br/>MI repuesto: 14.00 ml</td> </tr> <tr> <td>GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-000-02<br/>MI repuesto: 2.70 ml</td> <td>GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-000-03<br/>MI repuesto: 155.96 ml</td> </tr> <tr> <td>GN-LM-PE-MSJ S000300-MA-000<br/>MI repuesto: 366.94 ml</td> <td>GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-000<br/>MI repuesto: 15.60 ml</td> </tr> <tr> <td>GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-001<br/>MI repuesto: 10.70 ml</td> <td>GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-002<br/>MI repuesto: 3.30 ml</td> </tr> <tr> <td>GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-003<br/>MI repuesto: 3.80 ml</td> <td></td> </tr> </table> <p>Total semanal repuesto : 601.70 ml<br/> <b>Porcentaje acumulado Fase 2</b><br/> <math>((24029.76/24029.76)*100)=100\%</math> </p> |                        |                                                                                  | GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-004<br>MI repuesto: 28.70 ml | GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-002<br>MI repuesto: 14.00 ml  | GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-000-02<br>MI repuesto: 2.70 ml | GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-000-03<br>MI repuesto: 155.96 ml | GN-LM-PE-MSJ S000300-MA-000<br>MI repuesto: 366.94 ml    | GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-000<br>MI repuesto: 15.60 ml | GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-001<br>MI repuesto: 10.70 ml | GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-002<br>MI repuesto: 3.30 ml | GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-003<br>MI repuesto: 3.80 ml |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-004<br>MI repuesto: 28.70 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-002<br>MI repuesto: 14.00 ml                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-000-02<br>MI repuesto: 2.70 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GN-LM-PE-MSJ S000400-MA-000-03<br>MI repuesto: 155.96 ml                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| GN-LM-PE-MSJ S000300-MA-000<br>MI repuesto: 366.94 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-000<br>MI repuesto: 15.60 ml                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-001<br>MI repuesto: 10.70 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-002<br>MI repuesto: 3.30 ml                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| GN-LM-PE-MSJ S000500-MA-003<br>MI repuesto: 3.80 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                | <p><b>Porcentaje acumulado Fase 1-2</b><br/> <math>((24994.94/24994.94)*100)=100\%</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>2.4</th> <th>GASIFICACIÓN</th> <th>% DE AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2.4.1</td><td>Excavación, relleno y compactación de base y sub base</td><td>70.00%</td></tr> <tr><td>2.1.2</td><td>Reposición de pavimento</td><td>50.00%</td></tr> <tr><td>2.1.3</td><td>Limpieza de obra</td><td>50.00%</td></tr> <tr><td>2.1.4</td><td>Entrega de obra</td><td>0.00%</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GASIFICACIÓN           | % DE AVANCE                                                                      | 2.4.1                                                | Excavación, relleno y compactación de base y sub base | 70.00%                                                 | 2.1.2                                                    | Reposición de pavimento                                  | 50.00%                                               | 2.1.3                                                | Limpieza de obra                                    | 50.00%                                              | 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entrega de obra         | 0.00%   |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GASIFICACIÓN                                                                                                                            | % DE AVANCE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Excavación, relleno y compactación de base y sub base                                                                                   | 70.00%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reposición de pavimento                                                                                                                 | 50.00%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Limpieza de obra                                                                                                                        | 50.00%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entrega de obra                                                                                                                         | 0.00%          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Comentarios :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                | En proceso de construcción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| III RESUMEN EJECUTIVO DE EJECUCION DE REDES EXTERNAS ESTADO DE PRICIPALES ENTREGABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>% DE AVANCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Recorrido informativo(difusión de obra) y inicio de obra</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>2</td><td>Detección de interferencia</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>3</td><td>Excavación de calicatas</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>4</td><td>Excavación de zanja</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>5</td><td>Registro de trazabilidad de soldadura electrofusión</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>6</td><td>Registro de trazabilidad de soldadura termofusión</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>7</td><td>Informe tecnico de compactación de base y Sub base</td><td>99.70%</td></tr> <tr><td>8</td><td>Formato de prueba de hermeticidad</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>9</td><td>Acta de prueba de hermeticidad</td><td>100.00%</td></tr> <tr><td>10</td><td>Acta de barrido y llenado de Redes PE (Gasificación)</td><td>76.21%</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  | ITEM                                                 | DESCRIPCION                                           | % DE AVANCE                                            | 1                                                        | Recorrido informativo(difusión de obra) y inicio de obra | 100.00%                                              | 2                                                    | Detección de interferencia                          | 100.00%                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Excavación de calicatas | 100.00% | 4                         | Excavación de zanja              | 100.00% | 5     | Registro de trazabilidad de soldadura electrofusión | 100.00% | 6     | Registro de trazabilidad de soldadura termofusión | 100.00%    | 7     | Informe tecnico de compactación de base y Sub base | 99.70%  | 8             | Formato de prueba de hermeticidad | 100.00% | 9      | Acta de prueba de hermeticidad | 100.00% | 10                                                                                                                                                                                                         | Acta de barrido y llenado de Redes PE (Gasificación) | 76.21% |     |                |             |       |                         |         |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                             | % DE AVANCE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Recorrido informativo(difusión de obra) y inicio de obra                                                                                | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detección de interferencia                                                                                                              | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Excavación de calicatas                                                                                                                 | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Excavación de zanja                                                                                                                     | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de trazabilidad de soldadura electrofusión                                                                                     | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de trazabilidad de soldadura termofusión                                                                                       | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informe tecnico de compactación de base y Sub base                                                                                      | 99.70%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Formato de prueba de hermeticidad                                                                                                       | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acta de prueba de hermeticidad                                                                                                          | 100.00%        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acta de barrido y llenado de Redes PE (Gasificación)                                                                                    | 76.21%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| SUPERVISIÓN END PERU S.A.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                | SUPERVISIÓN F.I.S.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| <br> <b>Tony Blas Cristobal</b><br>Supervision Redes HDP<br>CIP 262842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                | <b>Ing. Francisco Benites Bocanegra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |
| Ing. Tony Blas Cristobal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                  |                                                      |                                                       |                                                        |                                                          |                                                          |                                                      |                                                      |                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |         |                           |                                  |         |       |                                                     |         |       |                                                   |            |       |                                                    |         |               |                                   |         |        |                                |         |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |        |     |                |             |       |                         |         |

END

PERÚ S.A.C.

FISE

FORMATO

INFORME SEMANAL DE TRABAJO - ISO

END-FPY-FI-05

Fecha : 01-ago.-25

Versión : 001

PROYECTO :

"PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO"

CONTRATISTA :

NAGASCO

SUPERVISIÓN. :

END PERU S.A.C.

LUGAR DE SUPERVISIÓN :

Vía expresa sur/ Los Nogales / Av. La Cultura / Av. 8 de Diciembre -San Jeronimo

CLIENTE. :

FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGETICO - FISE

FECHA DEL INFORME :

domingo, 9 de Agosto de 2026

PLAZO :

270 Dias

HOJA

2 DE 4

MONTO CONTRACTUAL :

\$ 5,552,825.29 +. IGV

AVANCE FASE1 - FASE2:

100.00%

AVANCE FASE 2:

100.00%

Nº INFORME :

ISO - CU - REDES - 039

AVACE PRUEBAS DE HERMETICIDAD:

100.00%

PERIODO (DEL - AL) :

03-ago.-2609-ago.-26

IVANEXO 01 – CONTROL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES

1. Control de Reuniones de Coordinación

Ítem

Fecha

Tipo de reunión

Entidades participantes

N° de acta

1

No se realizaron reuniones durante el período evaluado

-

-

-

Total de reuniones sostenidas en la semana: 01 reunión

Lugar:

No aplica

Duración

No aplica

Durante el período evaluado no se realizaron reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto entre FISE, la Interventoría (END Perú S.A.C.) y la Contratista (NAGASCO); por lo tanto, no se generaron actas de reunión ni compromisos asociados durante la presente semana.

VRESUMEN DE LOS PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Durante el período evaluado no se realizaron reuniones de coordinación y seguimiento del proyecto entre FISE, la Interventoría (END Perú S.A.C.) y la Contratista (NAGASCO); por lo tanto, no se generaron actas de reunión ni compromisos asociados durante la presente semana.

✓ Durante el período evaluado no se realizaron reuniones periódicas de seguimiento del proyecto, por lo que no existen puntos técnicos, operativos o administrativos tratados entre las partes involucradas.

VI

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO

ITEM




COMPROMISO


RESPONSABLE

1

No se generaron compromisos durante el período evaluado.

NO APLICA
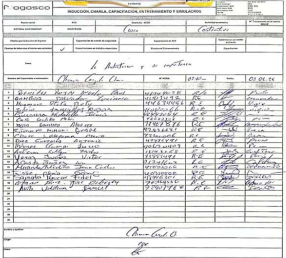
| <div>   </div>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | FORMATO        |                                                                                                                                                                                     | END-FPY-FI-05          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME SEMANAL DE TRABAJO - ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     | Fecha :                | 01-ago.-25                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     | Versión :              | 001                                                                              |
| PROYECTO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "PROYECTO ESPECIAL DE MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGIÓN CUSCO" |                |                                                                                                                                                                                     | CONTRATISTA :          | NAGASCO                                                                          |
| SUPERVISIÓN. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | END PERU S.A.C.                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     | LUGAR DE SUPERVISIÓN : | Vía expresa sur/ Los Nogales / Av. La Cultura / Av. 8 de Diciembre -San Jeronimo |
| CLIENTE. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL ENERGETICO - FISE                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                     | FECHA DEL INFORME :    | domingo, 9 de Agosto de 2026                                                     |
| PLAZO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270 Dias                                                                                                                                | HOJA           | 3 DE 4                                                                                                                                                                              | MONTO CONTRACTUAL :    | \$ 5,552,825.29 +. IGV                                                           |
| AVANCE FASE 1 - FASE2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00%                                                                                                                                 | AVANCE FASE 2: | 100.00%                                                                                                                                                                             | Nº INFORME             | ISO - CU - REDES - 039                                                           |
| AVANCE PRUEBAS DE HERMETICIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | 100.00%        |                                                                                                                                                                                     | PERIODO (DEL - AL)     | 03-ago.-26 09-ago.-26                                                            |
| VII REGISTRO FOTOGRÁFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
| <div>     </div>         |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
| Supervisión de los trabajos de reposición GN-LM-PE-MSJ-S000400-MA-004, Verificación de la charla de 5 min                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                | Verificación del slump 7" Verificación de las probetas de concreto                                                                                                                  |                        |                                                                                  |
| <div>     </div>     |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
| Verificación de los trabajos de reposición de concreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                | Verificación de los trabajos de reposición de concreto                                                                                                                              |                        |                                                                                  |
| <div>     </div> |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
| Supervisión de los trabajos de reposición GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-000, Verificación de la charla de 5 min                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                | Verificación de la llegada de la mezcla asfáltica Verificación de la mezcla asfáltica                                                                                               |                        |                                                                                  |
| <div>     </div> |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
| Verificación de la temperatura de la mezcla asfáltica T:55°C, no cumple con lo requerido, la cual fue observado y rechazado, por la supervisión y contratista                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                | Verificación de la granulometría de la mezcla asfáltica 9-6cm no cumpliendo con lo requerido del diseño marshall Se verifica gran tamaño de la granulometría de la mezcla asfáltica |                        |                                                                                  |
| <div>     </div> |                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                  |
| Supervisión de los trabajos de reposición GN-LM-PE-MSJ-S000400-MA-002/GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-001, Verificación de la charla de 5 min                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                | Verificación de la mezcla asfáltica Verificación de la temperatura de la mezcla asfáltica T°: 145°C                                                                                 |                        |                                                                                  |

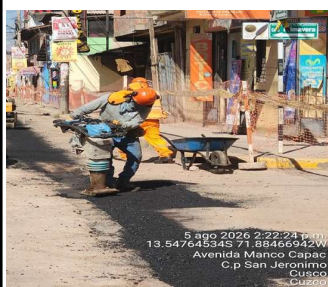

5 ago 2026 2:22:24 p.m.  
13.547645345 71.88465042W  
Avenida Manco Capac  
C.p San Jeronimo  
Cuzco



5 ago 2026 2:23:54 p.m.  
13.547667023 71.88465113W  
105 3S  
C.p San Jeronimo  
Cuzco



5 ago 2026 2:09:28 p.m.  
13.5476593 71.88400145W  
105 3S  
C.p San Jeronimo  
Cuzco



5 ago 2026 3:00:13 p.m.  
13.54792216S 71.88390997W  
142 Prolongación de la Cultura  
Cuzco  
Cuzco

Verificación de los trabajos de reposición de asfalto

Verificación de los trabajos de reposición de asfalto


| Ingeniero y la cantidad de bitumen |             |              |              |              |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NO. DE ORDEN                       | DESCRIPCION | FECHA        | PROYECTO     | NO. DE ORDEN | FECHA        |
| 1                                  | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 1            | 13.547645345 |
| 2                                  | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 2            | 13.547667023 |
| 3                                  | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 3            | 13.5476593   |
| 4                                  | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 4            | 13.54792216S |
| 5                                  | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 5            | 13.547645345 |
| 6                                  | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 6            | 13.547667023 |
| 7                                  | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 7            | 13.5476593   |
| 8                                  | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 8            | 13.54792216S |
| 9                                  | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 9            | 13.547645345 |
| 10                                 | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 10           | 13.547667023 |
| 11                                 | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 11           | 13.5476593   |
| 12                                 | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 12           | 13.54792216S |
| 13                                 | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 13           | 13.547645345 |
| 14                                 | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 14           | 13.547667023 |
| 15                                 | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 15           | 13.5476593   |
| 16                                 | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 16           | 13.54792216S |
| 17                                 | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 17           | 13.547645345 |
| 18                                 | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 18           | 13.547667023 |
| 19                                 | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 19           | 13.5476593   |
| 20                                 | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 20           | 13.54792216S |



6 ago 2026 11:56:32 p.m.  
19L 1875633 8500504  
7 Prolongación de la Cultura  
C.p San Jeronimo  
Cuzco  
99°9'0p90



6 ago 2026 10:12:24 a.m.  
19L 187566 8500512  
509 Avenida Manco Capac  
C.p San Jeronimo  
Cuzco  
99°9'0p90

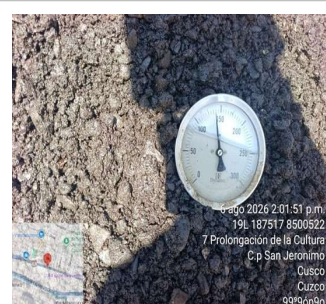

6 ago 2026 2:01:51 p.m.  
19L 187584 8500504  
7 Prolongación de la Cultura  
C.p San Jeronimo  
Cuzco  
99°9'0p90

Supervisión de los trabajos de reposición GN-LM-PE-MSJ-S000300-MA-000, Verificación de la charla de 5 min


Verificación de la imprimación  
Verificación de la temperatura de la mezcla asfáltica T°: 140°C



6 ago 2026 2:26:52 p.m.  
19L 187587 8500502  
Asoc Villa los Rosales  
Cuzco  
99°9'0p90



6 ago 2026 2:27:02 p.m.  
19L 187596 8500504  
Asoc Villa los Rosales  
Cuzco  
99°9'0p90

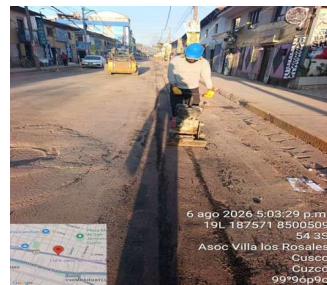

6 ago 2026 5:03:29 p.m.  
19L 187571 8500509  
Asoc Villa los Rosales  
Cuzco  
99°9'0p90



6 ago 2026 5:01:42 p.m.  
19L 187584 8500504  
509 Avenida Manco Capac  
C.p San Jeronimo  
Cuzco  
99°9'0p90


Verificación de los trabajos de reposición de asfalto

Verificación de los trabajos de reposición de asfalto

| Ingeniero y la cantidad de bitumen |             |              |              |              |              |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| NO. DE ORDEN                       | DESCRIPCION | FECHA        | PROYECTO     | NO. DE ORDEN | FECHA        |
| 1                                  | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 1            | 13.547645345 |
| 2                                  | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 2            | 13.547667023 |
| 3                                  | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 3            | 13.5476593   |
| 4                                  | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 4            | 13.54792216S |
| 5                                  | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 5            | 13.547645345 |
| 6                                  | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 6            | 13.547667023 |
| 7                                  | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 7            | 13.5476593   |
| 8                                  | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 8            | 13.54792216S |
| 9                                  | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 9            | 13.547645345 |
| 10                                 | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 10           | 13.547667023 |
| 11                                 | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 11           | 13.5476593   |
| 12                                 | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 12           | 13.54792216S |
| 13                                 | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 13           | 13.547645345 |
| 14                                 | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 14           | 13.547667023 |
| 15                                 | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 15           | 13.5476593   |
| 16                                 | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 16           | 13.54792216S |
| 17                                 | Asfalto     | 13.547645345 | 71.88465042W | 17           | 13.547645345 |
| 18                                 | Asfalto     | 13.547667023 | 71.88465113W | 18           | 13.547667023 |
| 19                                 | Asfalto     | 13.5476593   | 71.88400145W | 19           | 13.5476593   |
| 20                                 | Asfalto     | 13.54792216S | 71.88390997W | 20           | 13.54792216S |



7 ago 2026 12:49:23 p.m.  
19L 187506 8500543  
377 Avenida Manco Capac  
C.p San Jeronimo  
Cuzco  
99°9'0p90

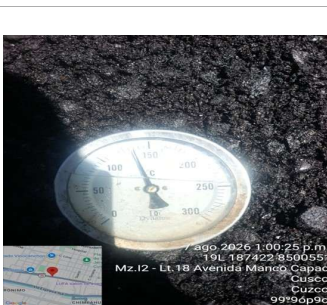

7 ago 2026 1:00:25 p.m.  
19L 187422 8500551  
Mz.12 - Lt.18 Avenida Manco Capac  
Cuzco  
99°9'0p90



7 ago 2026 11:46:03 a.m.  
19L 187408 8500585  
Mz.12 - Lt.15 Avenida Manco Capac  
C.p San Jeronimo  
Cuzco  
99°9'0p90

Supervisión de los trabajos de reposición S000300-MA-000/S000500-MA-000/S000500-MA-001/S000500-MA-002/S000500-MA-003, Verificación de la charla de 5 min

Verificación de la temperatura de la mezcla asfáltica T°: 140°C  
Verificación de la imprimación



7 ago 2026 12:49:23 p.m.  
19L 187308 8500529  
Los Jardines  
Cuzco  
99°9'0p90



7 ago 2026 12:12:25 p.m.  
19L 187407 8500529  
38 Carretera Cuzco - Puno  
Los Jardines  
Cuzco  
99°9'0p90



7 ago 2026 5:11:42 p.m.  
19L 187413 8500536  
Los Jardines  
Cuzco  
99°9'0p90



7 ago 2026 5:28:51 p.m.  
19L 187353 8500533  
20 Prolongación de la Cultura  
Los Jardines  
Cuzco  
99°9'0p90

Verificación de la llegada del camión de asfalto  
Verificación de la temperatura de la mezcla asfáltica T°: 160°C

Verificación de los trabajos de reposición de asfalto

La Curva S del avance acumulado correspondiente a la Fase 1 y 2 evidencia el cumplimiento del cronograma contractual, registrándose un avance planificado y ejecutado de 100.00 %, con un SPI de 1.00. Este resultado confirma la culminación de las actividades constructivas conforme a la programación establecida, reflejando un adecuado desempeño durante la ejecución del proyecto. En ese sentido, la Supervisión continuará efectuando el seguimiento a las actividades finales de gasificación, cierre de observaciones y cierre contractual, con el propósito de garantizar la conclusión integral del proyecto conforme a los requisitos técnicos y contractuales.



La Fase 2 del proyecto contempla un metrado contractual de 25,180.00 ml, con un metrado asignado inicial de 23,962.60 ml. Mediante la Carta N.º 01356-2026-FISE se aprobó la desestimación de 512.82 ml, obteniéndose un metrado asignado vigente de 23,449.78 ml. Asimismo, considerando la actualización de los tramos corregidos, el metrado asignado corregido asciende a 24,029.76 ml. Al cierre del periodo evaluado, la ejecución constructiva y las pruebas de hermeticidad alcanzan el 100.00 % del metrado asignado corregido, equivalente a 24,029.76 ml. Respecto a la gasificación, se registra un avance acumulado de 18,312.19 ml, equivalente al 76.21 %. En consecuencia, las actividades constructivas se encuentran culminadas, manteniéndose pendientes la gasificación de los tramos restantes y las actividades de reposición de pavimentos y levantamiento de observaciones, necesarias para el cierre integral del proyecto.



La Curva S del avance acumulado correspondiente a la Fase 2 refleja el cumplimiento del cronograma contractual, registrándose un avance planeado y ejecutado de 100.00 %, con un SPI de 1.00. Este resultado evidencia la culminación de las actividades constructivas conforme a la programación establecida y un adecuado desempeño durante la ejecución del proyecto. En adelante, el seguimiento de la Supervisión estará orientado a la culminación de las actividades de gasificación de las mallas pendientes, así como al cierre de observaciones y del proceso contractual, a fin de garantizar la puesta en servicio integral de las redes ejecutadas y la conclusión satisfactoria del proyecto.

## ASIGNACIONES EN EJECUCIÓN - FASE 2

|                             |                                   |                          |                                               |                                |                                |                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TOTAL ML PE CONTRATO</b> | <b>ML PE ASIGNADOS</b>            | <b>ML PE CONSTRUIDOS</b> | <b>ML PE POR CONSTRUIR</b>                    | <b>% CONSTRUIDO (CONTRATO)</b> | <b>% CONSTRUIDO (ASIGNADO)</b> | <b>% CONSTRUIDO (ASIGNADO CORREGIDO)</b> |
| <b>25.180</b>               | <b>23.449,78</b>                  | <b>24.029,76</b>         | <b>-579,98</b>                                | <b>95.43 %</b>                 | <b>102.47 %</b>                | <b>100.00 %</b>                          |
|                             | <b>ML PE ASIGNADOS CORREGIDOS</b> |                          | <b>ML PE POR CONSTRUIR ASIGNADO CORREGIDO</b> |                                |                                |                                          |
|                             | <b>24.029,76</b>                  |                          | <b>0.00</b>                                   |                                |                                |                                          |

| RESUMEN DE ASIGNACIONES        | ML PE ASIGNADOS  | ML PE CONSTRUIDOS | ML PE POR CONSTRUIR | ML PE POR CONSTRUIR CORREGIDO | FECHA DE INICIO | % CONSTRUIDO      | % CONSTRUIDO CORREGIDO |
|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| <b>FASE 2</b>                  | <b>23.449,78</b> | <b>24.029,76</b>  | <b>-579,98</b>      |                               | <b>0,00</b>     | <b>13/01/2026</b> | <b>102,47 %</b>        |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-001    | 472,44           | 542,57            | -70,13              |                               | 0,00            | 10/03/2026        | 114,84 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-000-03 | 1.533,21         | 1.722,30          | -189,09             |                               | 0,00            | 15/04/2026        | 112,33 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-005    | 594,47           | 612,68            | -18,21              |                               | 0,00            | 26/03/2026        | 103,06 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-002    | 1.786,14         | 1.834,95          | -48,81              |                               | 0,00            | 13/01/2026        | 102,73 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-000-02 | 716,40           | 735,51            | -19,11              |                               | 0,00            | 08/05/2026        | 102,67 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-004    | 1.992,18         | 2.031,26          | -39,08              |                               | 0,00            | 22/01/2026        | 101,96 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000200-MA-002    | 2.166,12         | 2.208,00          | -41,88              |                               | 0,00            | 03/03/2026        | 101,93 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-002    | 1.591,69         | 1.621,46          | -29,77              |                               | 0,00            | 18/02/2026        | 101,87 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-003    | 1.868,93         | 1.903,25          | -34,32              |                               | 0,00            | 05/02/2026        | 101,84 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-003    | 1.365,05         | 1.390,10          | -25,05              |                               | 0,00            | 10/02/2026        | 101,84 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-001    | 1.858,52         | 1.891,44          | -32,92              |                               | 0,00            | 20/02/2026        | 101,77 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-006    | 1.325,75         | 1.345,54          | -19,79              |                               | 0,00            | 07/04/2026        | 101,49 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000200-MA-000    | 806,03           | 817,33            | -11,30              |                               | 0,00            | 10/04/2026        | 101,40 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000200-MA-001    | 1.090,45         | 1.104,71          | -14,26              |                               | 0,00            | 24/02/2026        | 101,31 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-002    | 1.658,16         | 1.668,30          | -10,14              |                               | 0,00            | 14/02/2026        | 100,61 %               |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-004    | 1.503,16         | 1.497,26          | 5,90                |                               | 0,00            | 03/02/2026        | 99,61 %                |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-000    | 1.042,84         | 1.038,20          | 4,64                |                               | 0,00            | 26/03/2026        | 99,56 %                |
| <b>Total</b>                   | <b>23.449,78</b> | <b>24.029,76</b>  | <b>-579,98</b>      |                               | <b>0,00</b>     | <b>13/01/2026</b> | <b>102,47 %</b>        |

Durante el periodo de evaluación, la Fase 2 del proyecto alcanzó la culminación de las actividades constructivas, registrándose un total de 24,029.76 ml ejecutados, equivalente al 95.43 % respecto al metrado contractual, 102.47 % respecto al metrado asignado vigente y 100.00 % respecto al metrado asignado corregido. Dicho avance corresponde a la ejecución de las mallas programadas para la Fase 2, evidenciándose la conclusión de la etapa de construcción conforme a las asignaciones aprobadas. En consecuencia, el seguimiento de la Supervisión se orienta al proceso de gasificación de las mallas pendientes, reposición y levantamiento de observaciones, al cierre técnico y contractual del proyecto.

## ASIGNACIÓN Y GASIFICACIONES - FASE 2

|                        |                          |                          |                                |                              |                                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>ML PE ASIGNADOS</b> | <b>ML PE CONSTRUIDOS</b> | <b>ML PE GASIFICADOS</b> | <b>% GASIFICADO CONSTRUIDO</b> | <b>% GASIFICADO ASIGNADO</b> | <b>AÑO ASIGNACIÓN</b>                    |
| <b>23.449,78</b>       | <b>24.029,76</b>         | <b>18.312,19</b>         | <b>76.21 %</b>                 | <b>76.21 %</b>               | <input checked="" type="checkbox"/> 2025 |
|                        |                          |                          |                                |                              | <input type="checkbox"/> PROVINCIA       |
|                        |                          |                          |                                |                              | <input type="checkbox"/> CUSCO           |

| RESUMEN DE GASIFICACIONES      | ML PE ASIGNADOS  | ML PE CONSTRUIDOS | FECHA GASIFICACION | ML PE GASIFICADOS | ML PE POR GASIFICAR (CONSTRUIDO) | ML PE POR GASIFICAR (ASIGNADO) |
|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>FASE 2</b>                  | <b>23.449,78</b> | <b>24.029,76</b>  | <b>18/07/2026</b>  | <b>18.312,19</b>  | <b>5.717,57</b>                  | <b>5.137,59</b>                |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-004    | 1.992,18         | 2.031,26          | 21/07/2026         | 2.031,26          | 0,00                             | -39,08                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-003    | 1.868,93         | 1.903,25          | 25/07/2026         | 1.903,25          | 0,00                             | -34,32                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-001    | 1.858,52         | 1.891,44          | 25/07/2026         | 1.891,44          | 0,00                             | -32,92                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-002    | 1.786,14         | 1.834,95          | 19/07/2026         | 1.834,95          | 0,00                             | -48,81                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-002    | 1.658,16         | 1.668,30          | 25/07/2026         | 1.668,30          | 0,00                             | -10,14                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-004    | 1.503,16         | 1.497,26          | 25/07/2026         | 1.497,26          | 0,00                             | 5,90                           |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-003    | 1.365,05         | 1.390,10          | 25/07/2026         | 1.390,10          | 0,00                             | -25,05                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-000-03 | 1.533,21         | 1.722,30          | 25/07/2026         | 1.332,90          | 389,40                           | 200,31                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-000-02 | 716,40           | 735,51            | 18/07/2026         | 1.124,91          | -389,40                          | -408,51                        |
| GN-LM-PE.MSJ-S000200-MA-001    | 1.090,45         | 1.104,71          | 25/07/2026         | 1.104,71          | 0,00                             | -14,26                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000300-MA-000    | 1.042,84         | 1.038,20          | 25/07/2026         | 1.038,20          | 0,00                             | 4,64                           |
| GN-LM-PE.MSJ-S000200-MA-000    | 806,03           | 817,33            | 25/07/2026         | 817,33            | 0,00                             | -11,30                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-005    | 594,47           | 612,68            | 18/07/2026         | 612,68            | 0,00                             | -18,21                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-000    | 78,24            | 64,90             | 25/07/2026         | 64,90             | 0,00                             | 13,34                          |
| GN-LM-PE.MSJ-S000200-MA-002    | 2.166,12         | 2.208,00          |                    | 0,00              | 2.208,00                         | 2.166,12                       |
| GN-LM-PE.MSJ-S000400-MA-006    | 1.325,75         | 1.345,54          |                    | 0,00              | 1.345,54                         | 1.325,75                       |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-001    | 472,44           | 542,57            |                    | 0,00              | 542,57                           | 472,44                         |
| GN-LM-PE.MSJ-S000500-MA-002    | 1.591,69         | 1.621,46          |                    | 0,00              | 1.621,46                         | 1.591,69                       |
| <b>Total</b>                   | <b>23.449,78</b> | <b>24.029,76</b>  | <b>18/07/2026</b>  | <b>18.312,19</b>  | <b>5.717,57</b>                  | <b>5.137,59</b>                |

| ML GASIFICADOS POR DISTRITO                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ML PE CONSTRUIDOS <input checked="" type="checkbox"/> ML PE GASIFICADOS <input type="checkbox"/> ML PE POR GASIFICAR |
|                                                                                                                                                          |

Respecto a la Fase 2 del proyecto, a la fecha de corte se cuenta con un metrado asignado vigente de 23,449.78 ml, actualizado conforme a la Carta N.º 01356-2026-FISE, mediante la cual se aprobó la desestimación de determinados tramos del proyecto. De dicho metrado, se han construido 24,029.76 ml y se han gasificado 18,312.19 ml, equivalente al 76.21 % respecto al metrado asignado y construido. En consecuencia, permanecen 5,717.57 ml pendientes de gasificación. Cabe precisar que la autorización emitida por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) para la ejecución de actividades de gasificación tuvo vigencia hasta el 25/07/2026, por lo que los tramos pendientes deberán ser incorporados en una nueva autorización para continuar con las actividades de habilitación y puesta en servicio, conforme a la programación aprobada del proyecto.



Durante el periodo de evaluación, se registra un total de 19,651.23 ml de tubería PE construidos, de los cuales 18,244.23 ml cuentan con reposición ejecutada, mientras que 1,407.00 ml se mantienen pendientes de reposición, lo que representa un avance acumulado de 92.84 % en las actividades de reposición de superficie.

Las reposiciones ejecutadas corresponden principalmente a pistas de asfalto, donde se concentra la mayor longitud intervenida. Las reposiciones pendientes se encuentran distribuidas en diferentes mallas del proyecto, destacándose los tramos asociados a las mallas S000200-MA-002, S000400-MA-000-03, S000500-MA-003, S000200-MA-000, S000400-MA-006, S000400-MA-002, S000300-MA-004, las cuales presentan los mayores metros lineales por reponer al cierre del periodo evaluado con respecto al grupo de reposición.

Asimismo, se precisa que la reposición correspondiente a la malla S000300-MA-004, con una longitud de 76.7 ml, se encuentra observada mediante No Conformidad (NC), por lo que dicho tramo no será considerado para valorización hasta el levantamiento y cierre correspondiente de la observación, de igual manera se precisa que la reposición correspondiente a la malla S000200-MA-002, con una longitud de 100.0 ml, se encuentra observado mediante No Conformidad (NC), por lo que dicho tramo no será considerado para valorización hasta el levantamiento y cierre correspondiente de la observación.

En consecuencia, al haberse culminado la etapa de construcción de redes, la Contratista mantiene sus esfuerzos enfocados en la ejecución de reposiciones pendientes, con el objetivo de concluir las obras civiles, levantar las observaciones existentes y lograr el cierre técnico y contractual del proyecto.
